



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNG PUTRI
KEPALA DESA CIANGSANA

Alamat : Jln. Raya KH.Rafe'i No.01 Kode Pos 16968 Tlp/Fax (021)84933618

Ciangsana, 4 Oktober 2024

Nomor : 147/261 / X / 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pemberitahuan selesainya pembangunan
Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahap I
Tahun Anggaran 2024

Yth.
Camat Gunung Putri
di
Tempat

Dengan Hormat

Dengan ini Kami sampaikan selesainya pelaksanaan pembangunan infrastruktur Bantuan Keuangan Kabupaten Bogor Tahap I TA 2023, sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	ALAMAT	TANGGAL
1.	BETONISASI JALAN DESA	KP. PABUARAN WETAN RT 001 RW 005	16 AGUSTUS 2024
2.	BETONISASI JALAN DESA	KP. PARUNG PINANG RT 001 RW 011	26 AGUSTUS 2024
3.	BETONISASI JALAN DESA	KP. PABUARAN WTAN RT 001 RW 017	14 SEPTEMBER 2024

Demikian kami sampaikan, atas perhatinnya diucapkan terima kasih.



Kepala Desa Ciangsana

YUDIN SAMPURA, S.H.,M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNG PUTRI

Jl. Raya Barokah No. 5 ☎/Fax (021) 8672122 Wanaherang Bogor 16965

Gunung Putri, 08 Oktober 2024

Nomor : 600.7.23.1/39 /- EKBANG
Sifat : Penting
Perihal : Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Infrastruktur
Desa Tahap I (60%) TA. 2024.

Yth.
Kepala Desa Ciangsana
Di,-

Tempat

Dasar :

1. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa pada tanggal 06 September 2022 dan telah di tanda tangani oleh Plt Bupati Bogor;
2. Keputusan Bupati Bogor Nomor 400.10/248/Kpts/Per-UU/2024. Tentang Desa Penerima Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2024;
3. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bogor, nomor 400.10.6.3 / 1640-Sapras tanggal 22 Mei 2024. Perihal Pemberitahuan Pengawasan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa TA. 2024;
4. Surat Kepala Desa Ciangsana, nomor 147/261/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024. Perihal Pemberitahuan Selesaiyanya Pembangunan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahap I Tahun Anggaran 2024 .

Atas dasar tersebut, diberitahukan kepada Kepala Desa pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2024 tahap I (satu) 60% Tahun Anggaran 2024, akan dilaksanakan pada :

Hari /Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024

Waktu : Pukul 09.30 s.d Selesai


Tempat : Kantor Desa Ciangsana

Dalam kegiatan dimaksud dengan ini kepada Kepala Desa untuk mempersiapkan :

1. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahap I 60% TA. 2024;
2. Pengisian Aplikasi *Single Sign On* (SSO) Tahap I (60%);
3. Mempersiapkan Foto Copy RAB Tahap I 60% yang sudah di tandatangani;
4. Menghadirkan TPK Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa dalam pendampingan monitoring dan evaluasi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Jabatan	Tanggal	Paraf
Selesai		
Kas	10/10/24	
Kas		
Terbukti	09/10/24	F



1. Yth. Pj. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Bogor.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNG PUTRI

Jl. Raya Barokah No. 5 ☎/Fax (021) 8672122 Wanaherang Bogor 16965

Gunung Putri, Oktober 2024

Nomor : 700.1.2.7 / 83 - EKBANG
Sifat : Penting
Perihal : Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi.

Yth.
Kepala Desa Ciangsana
Di-
Tempat

Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahap I (60 %) Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, bertempat di Desa Ciangsana. Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan LPJ Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2024, (*terlampir*);
2. Berita Acara Monitoring Fisik Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2024, (*terlampir*).


Atas hal tersebut untuk melengkapi :

1. Menyesuaikan dan melengkapi hasil Monitoring dan Evaluasi;
2. Melampirkan dokumentasi kesesuaian fisik;
3. Melampirkan surat sanggahan hasil Monitoring dan Evaluasi.

Untuk kelengkapan sebagaimana dimaksud, batas akhir paling lambat 7 (tujuh) hari dari surat ini dibuat.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

BOX PENGESAHAN		
JABATAN	TANGGAL	PARAF
Sekcam.		
Kasi EKBANG		
Kasubag UMPEG		
Operator	14/10/24	F

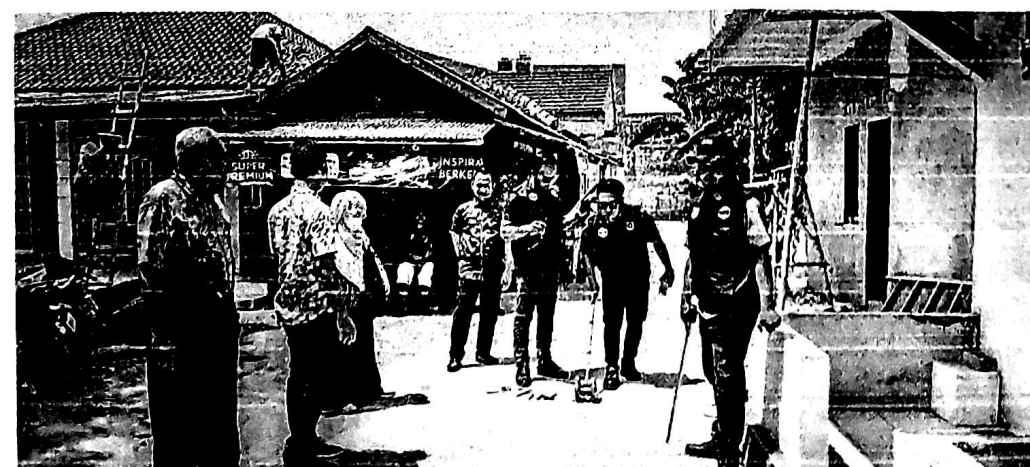
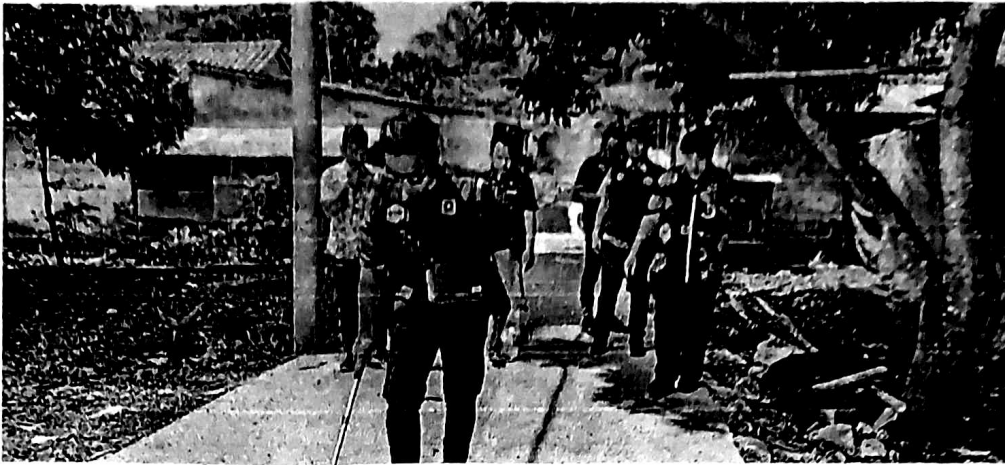


KURNIA INDRA, S.STP, M.Ec. Dev
NIP : 198205112000121003

Tembusan :

1. Yth. Pj Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Bogor.

**DOKUMENTASI KEGIATAN MONITORING BANTUAN KEUANGAN
INFRASTRUKTUR DESA TAHAP I 60% TAHUN ANGGARAN 2024
DESA CIANGSANA**



DAFTAR HADIR

KEGIATAN

**: Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa
Tahap I 60 % Tahun Anggaran 2024**

HARI / TANGGAL

: Kamis, 10 Oktober 2024

LOKASI

: Desa Clangsana

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNG PUTRI

Jl. Raya Barokah No. 5 ☎/Fax (021) 8672122 Wanaherang Bogor 16965

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN LPJ BANTUAN KEUANGAN INFRASTRUKTUR DESA
TAHAP I 60% TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Sepuluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri telah dilakukan pemeriksaan LPJ Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Lokasi : Kp. Pabuaran Wetan Rt 001 Rw 017
Kegiatan : Betonisasi Jalan Desa
Anggaran 60% : Rp. 336.819.000
Volume Pengajuan 60% : 495 m x 3 m x 0.15 m

NO	PERSYARATAN	HASIL		KET.
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Laporan Penggunaan Anggaran (LPA) 60% yang dibuat oleh TPK dan diketahui Kepala Desa terkait penggunaan anggaran	✓		
2	Laporan Kemajuan pembangunan fisik (progress report) Tahap I mencapai paling kurang 75% yang dtandatangani oleh TPK, Kepala Desa dan Pengawas Lapangan	✓		
3	Laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan Tahap I (60%) dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Per Sumber Dana PBK 1A dan 1B)	✓		
4.	Laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan Tahap I (60%) dari Aplikasi Pengajuan dan Pelaporan SAMISADE SINGLE SIGN ON (SSO)			
5.	Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahap I (60%)	✓		
6.	Dokumentasi Progress Kegiatan Tahap I (60%) yang menggunakan aplikasi GPS Map Camera (berwarna)	✓		

HASIL PEMERIKSAAN

1. Belum melengkapi bukti tanda terima tenaga kerja;
2. Belum melengkapi bukti / nota belanja bahan dan sewa alat;
3. Belum melengkapi bukti / nota oprasional;
4. Belum melengkapi dokumen pengadaan barang dan jasa.

REKOMENDASI

Lengkapi LPJ Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa TahunAnggaran 2024 Tahap I

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai bahan lebih lanjut.

Tim Verifikasi Kecamatan Gunung Putri

1.Ketua : Sekertaris Kecamatan

EKA NOVARI, S.STP, M.A
NIP.198611262006021001

2.Sekertaris : Kepala Seksi EKBANG

ADITHIA NUGRAHA, S.Kom, M.Si
NIP.198510302009021002



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN GUNUNGPUTRI

Jl. Raya Barokah No. 5 ☎/Fax (021) 8672122 Wanaherang Bogor 16965

BERITA ACARA MONITORING FISIK KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN INFRASTRUKTUR DESA TAHAP I 60% TAHUN ANGGARAN 2024

Hari & Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024
Lokasi : Kp. Pabuaran Wetan Rt 001 Rw 017
Kegiatan : Betonisasi Jalan Desa
Anggaran 60% : 336.819.000
Volume Pengajuan 60% : 495 m x 3 m x 0.15 m
Lampiran :

HASIL PEMERIKSAAN


- Volume Kubikasi Beton di RAB = 223 m³
Volume Kubikasi Beton Realisasi = 230.63 m³
Terdapat kelebihan Volume Kubikasi = 7.63 m³
- Volume Panjang di RAB = 495 m
Volume Panjang Realisasi = 529.9m
Terdapat kelebihan Volume Panjang = 34.9 m,
- Terdapat Retak pada STA (0+21.5), (0+33.9), (0+111.7), (3+64), (3+98), (3+183), (3+261), (3+276)

REKOMENDASI


- Perbaiki pada bagian beton yang retak;
- Sesuaikan Voume Kubikasi dan Volume Panjang dengan RAB yang telah di ajukan.


Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai bahan lebih lanjut.

Tim Verifikasi Kecamatan Gunung Putri

1.Ketua : Sekertaris Kecamatan 
EKA NOVARI S.STP, M.A.
NIP.198611262006021001

2.Sekertaris : Kepala Seksi EKBANG 
ADITHIA NUGRAHA, S.Kom, M.Si
NIP.198510302009021002

3.Anggota : Unsur Perangkat Daerah 
BADRUS ALIS
NIP.197606012009011002

4.Anggota : P3MD Kab. Bogor 
LELA YULIARTI, ST



**LEMBARAN PEMERIKSAAN
REALISASI KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN INFRASTRUKTUR DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**




Lokasi :

Kegiatan :

Anggaran 60% :


Volume Pengajuan 60% :

titik

VOLUME			KUBIKASI	KET
STA	:	P = L = T =	 = 0,5	
STA	:	0-25 P = L = 3.2.95 T = 0.15	= 11,25	21,5 relak
STA	:	25-  47.6 P = L = 3 T = 0.15	P = 24.6 L = 3 T = 0.15 } 11,07	33.9 relak
STA	:	47.6- 75 P = L = 3 T = 0.13	P = 25.4 L = 3 T = 0.13 } 10	
STA	:	75- 100 112.9 P = L = 3.01,3 T = 0.18, 0.13	P = 37.9 L = 3 T = 0.15 } 17	111.7 relak
STA	:	P = L = T = 0.13		P = 1.5 L = 4.3 T = 0.13 } = 0.8
STA	:	P = L = T = 0.15		P = 1.90 L = 3.61 T = 0.15 } = 0.7
STA	:	0-25 P = L = 2.97 T = 0.15	= 11	
STA	:	25-43.2 P = 10.2 L = 3 T = 0.15	= 8.12	
STA	:	0-25 P = L = 2.92 T = 0.19	= 10.43	

titik 2

titik 3

VOLUME			KUBIKASI	KET
STA	:	25-50 P= L= 3.05 T= 0.15	= 11.4	69 relak
STA	:	50-75 P= L= 3.05 T= 0.15	= 11.4	
STA	:	75-100 P= L= 3.1 T= 0.14	11	98 relak
STA	:	100-125 P= L= 3 T= 0.15	11.25	
STA	:	125-149 P= 13.6 L= 3 T= 0.14	= 8.2	
STA	:	149.6-168.8 P= 24.12 L= 2.27, 2.87 T= 0.15	= 2.57 } 9.3	
STA	:	168.8-175 P= 6.2 L= 3.3.09 T= 0.15, 0.11	= 3.02 } 9.35 = 0.113	
STA	:	175-200 P= 25 L= 3.18 T= 0.13	= 10.3	183 relak
STA	:	200-225 P= L= T=	 P= 2.12 L= 1.9 T= 0.13	20.8 relak 216 "
STA	:	 P= L= T=	 P= 2.145 L= 2.105 T= 0.13	0.6
STA	:	200-225 P= L= 3 T= 0.15	= 11.25	
STA	:	225-250 P= L= 3 T= 0.15	= 11.25	

VOLUME			KUBIKASI	KET
STA	:	150-275 P = L = 3 T = 0.15	11.25	Perda 261 276
STA	:	275-284 P = 3 L = 3 T = 0.12	3.24	
STA	:	284-320.3 P = 36.3 L = 284-26 T = 0.15-0.14	= 2.32 } 11.7 = 0.14	
STA	:	320.3 338.7 P = 18.4 L = 0.15 T = 3-2.4	} 7.4	
STA	:	338 371 P = 33 L = 1.98-2 T = 0.16	= 1.98 } 16	
STA	:	P = L = T =		
STA	:	P = L = T =	Volume kubikasi PAB = Volume kubikasi Real =	223 230.63 Lebih 7.63
STA	:	P = L = T =	Volume Pangang PAB = Volume Pangang Real =	495 529.9 Lebih 34.9
STA	:	P = L = T =		
STA	:	P = L = T =		
STA	:	P = L = T =		
STA	:	P = L = T =		

Demikian hasil ukur ini dibuat, sebagai bahan lebih lanjut.

Tim Verifikasi Kecamatan Gunung Putri

1.Ketua : Sekertaris Kecamatan

EKA NOVARI, S.STP, M.A
NIP.198611262006021001

2.Sekertaris : Kepala Seksi EKBANG

ADITHIA NUGRAHA, S.Kom, M.Si
NIP.198510302009021002

3.Anggota : Unsur Perangkat Daerah

BADRUSALIS
NIP.197606012009011002

4.Anggota : P3MD Kab. Bogor

LELA YULIARTI, ST

Pengguna Anggaran
Kepala Desa Ciangsana

Mengetahui,
CAMAT



KURNIA INDRA, S.STP, M.Ec. Dev
NIP.198205112000121003



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNG PUTRI
DESA CIANGSANA

JL. RAYA KH RAFE'I NO.1 RT 01,RW 30 KODE POS 16968 TELP./FAX 021-84941590

Ciangsana, 08 November 2024

Nomor : 147 / 209 / XI/ 2024
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pada
Desa Ciangsana TA 2024

Kepada Yth :
CAMAT GUNUNG PUTRI

Di
Gunung Putri

Menanggapi hasil Tim Monitoring dan evaluasi Tahap I 60% Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2024, Pada Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Tahun 2024. Berikut tanggapan dari hasil pemeriksaan:

No	Judul dan Kondisi	Tanggapan Audit	Tindak Lanjut
1	Kegiatan Betonisasi jalan Desa Kp. Pabuaran Wetan RT 001 RW 017. - Terdapat retak belah pada STA (0+21.5), (0+33.9), (0+111.7), (3+64),(3+98),(3+183) , (3+261), (3+276). - Volume kubikasi beton di RAB = 223 m3. Volume kubikasi beton realisasi = 230.63 m3. Terdapat kelebihan volume kubikasi = 7.63 m3 - Volume panjang di RAB =495 m. Volume panjang realisasi = 529.9 meter. Terdapat kelebihan volume panjang =34.9 meter. - Lengkapi LPJ Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2024 tahap I (60%).	Atas hasil Monitoring dan evaluasi yang dilakukan bahwa terdapat retak, dan kelebihan volume kubikasi dan volume Panjang, maka dengan itu Kepala Desa Ciangsana menugaskan TPK untuk melakukan perapihan terhadap bagian beton yang retak tersebut, dan menyesuaikan volume kubikasi dan volume Panjang dengan RAB yang diajukan Lengkapi LPJ Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2024 Tahap I 60 %.	Rekomendasi telah ditidakanjuti. TPK merapihkan jalan beton yang retak dengan menambalnya (dokumentasi terlampir) Melengkapi dokumen bukti tanda terima Upah Tenaga Karja (terlampir) Melengkapi dokumen bukti nota belanja bahan dan sewa alat (terlampir) Melengkapi dokumen bukti nota operasional (terlampir) Melengkapi dokumen pengadaan barang dan jasa Sudah dilengkapi sesuai dengan hasil pemeriksaan tim verifikasi (terlampir LPJ Bantuan Infrastruktur desa TA 2024 Tahap I 60%)

Demikian surat tanggapan ini kami buat untuk menjadi bahan tindak lanjut sebagaimana mestinya.



(DIN SANG PUTRA., S.H.,M.M)

Tembusan :
- Yth BPD Desa Ciangsana.

DOKUMENTASI PERBAIKAN RETAKAN JALAN LOKASI BETONISASI JALAN DESA
KP. PABUARAN WETAN RT 001 RW 017

